

**Projektfortschrittsbericht
der Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.
über das Projekt
„Reconstruction of Manzooray as a Model Village”**

1. Juli bis 15. Oktober 2011

Bensheim, den 26. Oktober 2011

Oliver Neuschäfer – Programme & Internationale Kooperation –
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V., Nibelungenstr. 124, 64625 Bensheim

A. Projektkurzbeschreibung

| | |
|-----------------------------|--|
| Land: | Pakistan (Khyber Pakhtunkhwa Distrikt) |
| Ort: | Manzooray |
| Projektpartner: | CHEF Int. (Comprehensive Health & Education Forum International) |
| Projektbeginn: | 1. Juli 2011 |
| Projektende | 1. Februar 2012 |
| Gesamtkosten des Projektes: | EUR 177.750 |

Geplante Aktivitäten:

1. Renovierung der Basisgesundheitsstation in Manzooray
2. Renovierung der Jungenschule in Manzooray
3. Renovierung der Mädchenschule in Manzooray
4. Training für Lehrer und Lehrerinnen
5. Instandsetzung der Wasserversorgung von Manzooray
6. Verteilung von Saatgut und landwirtschaftlichen Geräten an die Einwohner
7. Trainings- und Fortbildungseinheiten für die Einwohner (Hygiene, Ernährung, Landwirtschaft, Elektronik)



▣ Die Gesundheitsstation in Manzoaray

B. Aktivitäten 1. Juli bis 15. Oktober 2011

Bisher kam es im Projekt zu erheblichen Verzögerungen, da wichtige Genehmigungen – sogenannte „Non Objection Certificates“ (NOCs) – für die geplanten Baumaßnahmen noch nicht erteilt waren.


Da von staatlicher Seite die Nothilfesituation im Juli offiziell für beendet erklärt wurde, hatten sich daraus resultierend administrative Änderungen für die Erteilung der NOCs ergeben. Der Partner CHEF hatte für das Projekt zwar zunächst alle notwendigen NOCs erhalten, diese waren aber nach der Änderung der Verwaltungszuständigkeiten nicht mehr gültig, sodass ein neuer Antragsprozess gestartet werden musste.

Die neuen NOC-Anträge wurden inzwischen alle genehmigt, sodass mit einem raschen Beginn aller anstehenden Baumaßnahmen gerechnet werden kann.

Neben der Beantragung der NOCs wurde außerdem bereits mit solchen Aktivitäten begonnen, deren Durchführung nicht von der Erteilung der NOCs abhängig ist. Dazu gehören:

1. Begutachtung der Gesundheitsstation (Basic Health Unit)


Die Begutachtung und Bewertung der beschädigten Gesundheitsstation wurde durch einen Ingenieur vorgenommen. Ein erstes Ausschreibungsverfahren brachte keine befriedigenden Ergebnisse, sodass ein zweites Ausschreibungsverfahren für die Renovierung stattfand. Dieses wurde inzwischen mit positivem Ergebnis abgeschlossen.

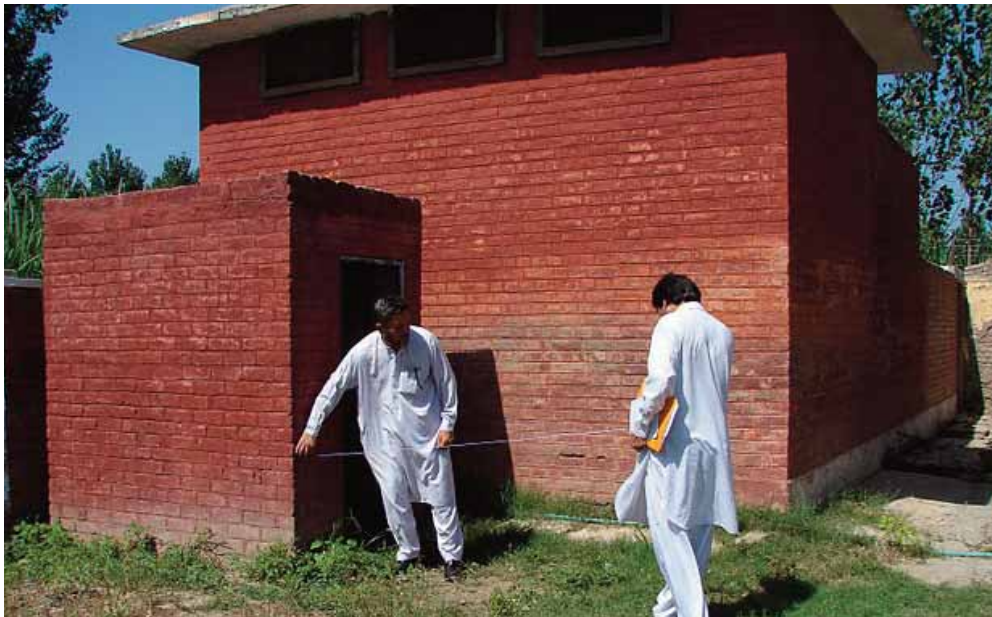

▣ Vermessung und Untersuchung der Gesundheitsstation



▣ Beschädigungen im Inneren des Gebäudes: Stromkabel liegen frei, der Putz bröckelt.

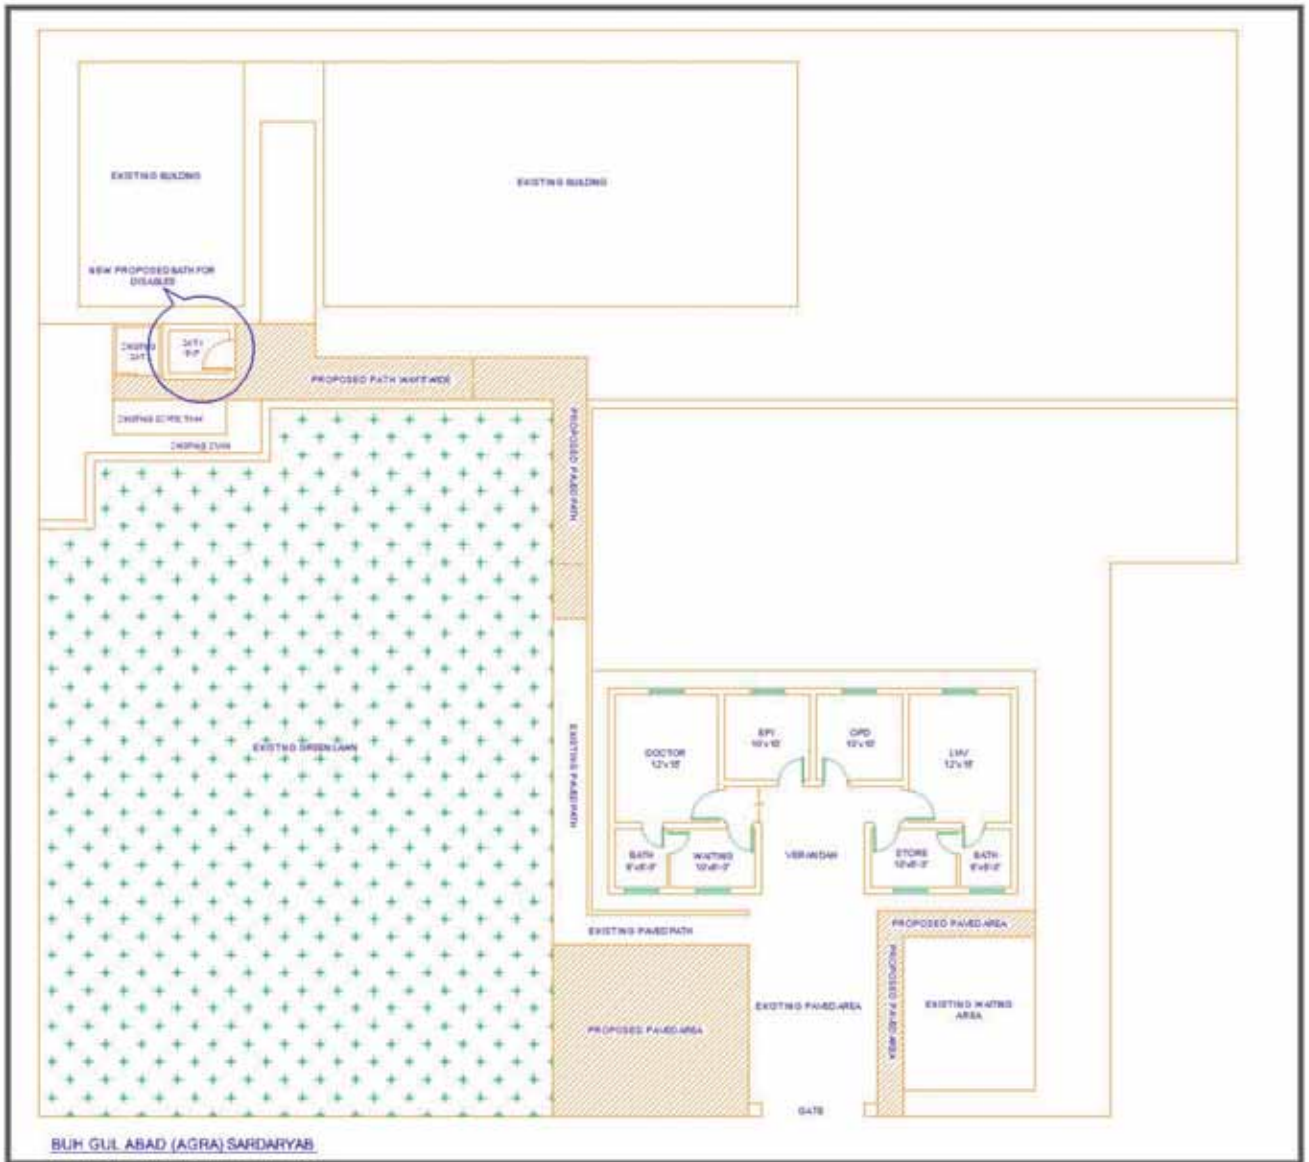

▣ Grundriss der Gesundheitsstation

2. Begutachtung der Jungenschule Manzooray

Ein Ingenieur führte die Begutachtung und Bewertung der Jungenschule durch. Das Ausschreibungsverfahren für die Renovierung ist abgeschlossen; der Vertrag mit dem entsprechenden Bauunternehmen wird in den kommenden Tagen unterzeichnet.

Darüber hinaus wurde der genaue Bedarf an Schulmöbeln ermittelt und ausgeschrieben. Das Ausschreibungsverfahren für die Möbel ist inzwischen beendet und die Möbel werden in ca. einem Monat geliefert. Bis dahin sollen die grundlegenden Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein.



■ Leeres Klassenzimmer der Schule. Die vom Wasser zerstörten Möbel wurden bereits entsorgt.



▣ Die zerstörte Wasserversorgung der Schule wird untersucht.



▣ Außenwand der Schule und Schulmauer. Auch hier sind die Spuren der Flut noch deutlich sichtbar.


3. Begutachtung der Mädchenschule Manzooray

Die Begutachtung der beschädigten Mädchenschule durch einen Ingenieur wurde durchgeführt. Das Ausschreibungsverfahren für die Renovierung ist beendet und der Vertrag mit dem entsprechenden Bauunternehmen wird in den kommenden Tagen unterzeichnet.

Darüber hinaus wurde der genaue Bedarf an Schulmöbeln ermittelt und ausgeschrieben. Das Ausschreibungsverfahren für die Möbel ist inzwischen abgeschlossen und die Möbel werden in ca. einem Monat geliefert. Bis dahin sollen die grundlegenden Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein.



▣ Außenbereich der Mädchenschule

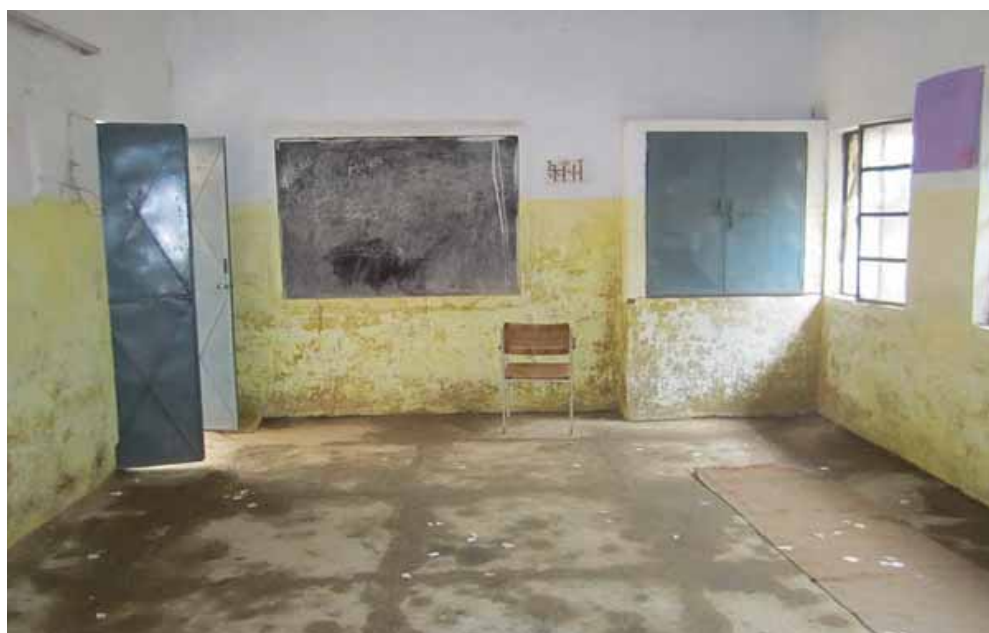

▣ Ein leeres Klassenzimmer der Mädchenschule. Auch hier wurden alle Möbel durch die Flut unbrauchbar, sodass diese neu angeschafft werden müssen

4. Training zum Thema „Inklusive Bildung“ für Lehrer und Lehrerinnen

Eine zweitägige Trainingseinheit für fünf Lehrer und Lehrerinnen aus Manzooray und der näheren Umgebung zum Thema „Inklusive Bildung“ wurde durchgeführt. Neben allgemeinen Aspekten zum Thema Behinderung ging es bei dem Training vor allem um die Identifizierung von Behinderungen bei Kindern und dem richtigen Umgang mit Kindern mit Behinderung.

TRAINING PROGRAMME FOR TEACHERS OF PRIMARY SCHOOLS MANZOORAY

Dated: 8th & 9th September 2011

Rights of Persons with Disability & Adoptability

Mr. Yasin Wali (Consulatnt)

| Date: 8 th September, 2011 | Topics | Resource Person |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| 8:30-9:00 am | Registration of Participants | |
| 9:00 -9:30 | INTRODUCTION OF CHEF,INT | CHEF,INT Representative |
| 9:30-11:30 | Definition of Disability ,Global Situation of Disability Major Causes of Disability Main Conditons affecting Child, Adult and Geriatric Population | Mr. Yasin Wali |
| 11:30- 11:45 | Tea Break | |
| 11:45- 1:30 | History/Culture of Disability Stigma,Exclusion,False Belief,charity | Mr. Yasin Wali |
| 1:30 to 2:3 | Prayer and Lunch Break | |
| 2:30 to 4:00 | INCLUSIVE EDUCATION | Mr. Rafiq Ahmad |
| 4:00-4:15 | Tea Break | |
| 4:15-5:00 | Primary Health Care | Mr. Yasin Wali |
| Date: 9 th September,2011 | Topic | Resource Person |
| 9:00-10:45 | The Situation of Women with Disability Globally | Mr. Yasin Wali |
| 10:45-11:00 | Tea Break | |
| 11:00-1:00 | Medical Management of Disability Multidisciplinary Team Approach | Mr. Rafiq Ahmad |
| | Prayer & Lunch Break | |
| 2:00-3:15 | UN conventional on The Rights of PWDs | Mr. Yasin Wali |
| 3:15-3:30 | Tea Break | |
| 3:30-4:15 | Vocation Rehabilitation /Decent Work for PWDs | Mr. Rafiq Ahmad |
| 4:15-5:00 | Community Based Rehabilitation | Mr. Yasin Wali |

▣ Programm des Lehrertrainings

Impressionen vom Lehrertraining „Inklusive Bildung“:



▣ Vortrag durch Herrn Yasin Wali



▣ Teilnehmende Lehrer und Lehrerinnen

C. Kommende Aktivitäten

Nachdem inzwischen alle notwendigen Berechtigungen für die Bauarbeiten eingeholt wurden und nahezu alle Ausschreibungsprozesse abgeschlossen sind, rechnen wir mit einem zügigen Beginn aller geplanten Bauarbeiten. Dazu gehören:

- => Renovierung der Jungenschule
- => Renovierung der Mädchenschule
- => Instandsetzung der Wasserversorgung
- => Renovierung der Gesundheitsstation

Zeitgleich zur Renovierung der Gesundheitsstation wird die Ausschreibung für einen Arzt und einen Assistenten (Einkauf und Verteilung von Verbrauchsgütern und Medikamenten) begonnen, sodass diese zeitnah nach Abschluss der Renovierung ihre Arbeit aufnehmen können.

Darüber hinaus werden auch die Trainingsmaßnahmen fortgesetzt. Nachdem nun bereits die Lehrer und Lehrerinnen zum Thema „Behinderung“ geschult wurden, werden in der kommenden Zeit Trainings für die Einwohner im Bereich Hygiene und Erste Hilfe angeboten.

Trotz der bisherigen Verzögerungen gehen wir zurzeit davon aus, dass das Projekt planmäßig zum 1. Februar 2012 abgeschlossen werden kann. Der nächste Projektfortschrittsbericht wird am 22. November 2011 bereitgestellt.

Bensheim, den 26. Oktober 2011

Oliver Neuschäfer
– Programme & Internationale Kooperation –
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.
